

Projekt do system łączenia maszyn

1. Na pierwszym schemacie pokazany proces działa operatora turbomixera z szczegółowym opisem co przyniesie nowy system.
2. W tablicy zrobiony projekt z zadaniami w załączniku jest też plik projektu
3. Koszt projektu w godzinach pracy i materiałach.

Dany projekt upraszcza prace na stanowisku przy maszynach co może też dać efekt większej jakości produktów.

WAŻNE

brać pod uwagę że system zabezpieczy tylko pierwszy krok w modernizacji procesu produkcji biszkoptów dalsze kroki są opierane na danym systemie i sumarycznie przynoszą większy efekt.




Nazwa zadania	Duration	Start	Finish
system nadrzędny do sterowania maszynami	57 days	Sat 4/12/25	Tue 7/1/25
Inicjacja projektu	6 days	Thu 5/1/25	Thu 5/8/25
Powołanie zespołu projektowego	2 days	Thu 5/1/25	Fri 5/2/25
Definiowanie celów i zakresu projektu	3 days	Mon 5/5/25	Wed 5/7/25
doprecyzowanie szczegółów współpracy	1 day	Thu 5/8/25	Thu 5/8/25
ustalenie harmonogramu dostępności maszyn	1 day	Thu 5/8/25	Thu 5/8/25
podpisanie umowy z pracodawcą	0 days	Thu 5/8/25	Thu 5/8/25
Planowanie projektu	9 days	Fri 5/9/25	Wed 5/21/25
analiza dostępnych zasobów	1 day	Fri 5/9/25	Fri 5/9/25
analiza maszyny 1	2 days	Mon 5/12/25	Tue 5/13/25
część elektroniczna(szafa sterownicza)	1 day	Mon 5/12/25	Mon 5/12/25
część mechaniczna(obudowa, części)	1 day	Tue 5/13/25	Tue 5/13/25
analiza maszyny 2	2 days	Wed 5/14/25	Thu 5/15/25
część elektroniczna(szafa sterownicza)	1 day	Wed 5/14/25	Wed 5/14/25
część mechaniczna(obudowa, części)	1 day	Thu 5/15/25	Thu 5/15/25
dobór odpowiednich części elektronicznych po typy działania	1 day	Fri 5/16/25	Fri 5/16/25
wstępnej wersja części do obudowy i modyfikacji maszyn	3 days	Mon 5/19/25	Wed 5/21/25
Realizacja projektu	17 days	Thu 5/22/25	Fri 6/13/25
złożenie zamówienia na części elektroniczne	1 day	Thu 5/22/25	Thu 5/22/25
wykonanie/druk 3d części obudowy	3 days	Fri 5/23/25	Tue 5/27/25
łączenie i napisanie programu do sterowania elektroniką	5 days	Wed 5/28/25	Tue 6/3/25
testowanie części elektronicznych	2 days	Wed 6/4/25	Thu 6/5/25
testowanie i uwagi do części mechanicznych	6 days	Fri 6/6/25	Fri 6/13/25
testy	1 day	Fri 6/6/25	Fri 6/6/25
przeróbka części mechanicznych	5 days	Mon 6/9/25	Fri 6/13/25
łączenie systemu z maszynami	3 days	Mon 6/16/25	Wed 6/18/25
testy końcowe	2 days	Thu 6/19/25	Fri 6/20/25
wdrążenie systemu na produkcje(ostateczne)	2 days	Mon 6/23/25	Tue 6/24/25
napisanie dokumentacji do projektu	3 days	Wed 6/25/25	Fri 6/27/25
oddanie systemu do utrzymania ruchu	0 days	Fri 6/27/25	Fri 6/27/25
Zakończenie projektu	2 days	Mon 6/30/25	Tue 7/1/25
Rozwiązanie zespołu projektowego	1 day	Mon 6/30/25	Mon 6/30/25
podtweirdzenie uzyskanych efektów	1 day	Tue 7/1/25	Tue 7/1/25
zarządzanie projektem	0 days	Sat 4/12/25	Sat 4/12/25
<Nowe zadanie>	0 days	Sat 4/12/25	Sat 4/12/25

RESOURCE COST OVERVIEW


COST STATUS

Cost status for work resources.

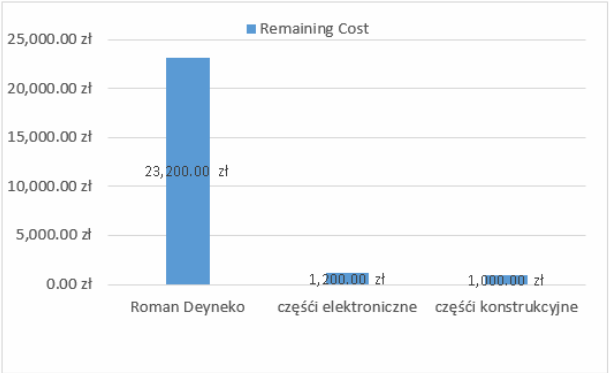

COST DISTRIBUTION

How costs are spread out amongst different resource types.

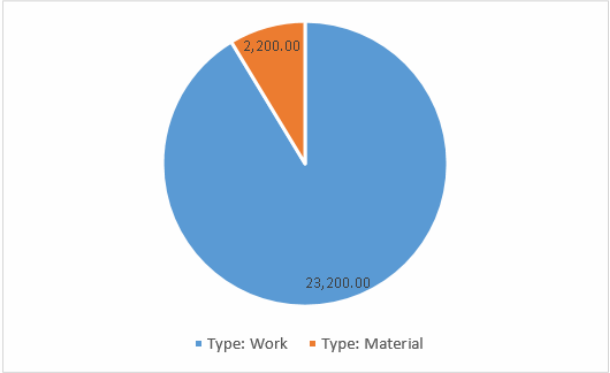

COST DETAILS

Cost details for all work resources.

Name	Actual Work	Actual Cost	Standard Rate
Roman Deyneko	0 hrs	0.00 zł	50.00 zł/hr
części elektroniczne	0	0.00 zł	1,200.00 zł
części konstrukcyjne	0	0.00 zł	1,000.00 zł

